

中辉学府项目

水土保持监测总结报告

建设单位：九江中广置业有限公司

监测单位：九江绿野环境工程咨询有限公司

2022年8月



证照编号: G032000014

营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
913604036697819104



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称	九江绿野环境工程咨询有限公司	注册资本	壹佰壹拾贰万元整
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2008年01月17日
法定代表人	周志刚	营业期限	2008年01月17日至2028年01月17日
经营范围	水土保持方案编制,水土保持监测,水土保持工程设计、监理,园林绿化工程(以上项目未取得资质不得经营)**	住所	江西省九江市浔阳区环城东路商业街区134号门面

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家市场监督管理总局监制



生产建设项目水土保持监测单位水平评价证书

(副本)

单位名称：九江绿野环境工程咨询有限公司

法定代表人：周志刚

单位等级：★★（2星）

证书编号：水土保持监测（赣）字第0019号

有效期：自2020年10月01日至2023年09月30日



发证机构：中国水土保持学会

发证时间：2020年11月12日

ISO 9001

华标认证
诚信致远



质量管理体系认证证书

证书编号: 34920Q11903R0S

统一社会信用代码: 913604036697819104

兹证明:

九江绿野环境工程咨询有限公司

质量管理体系符合:

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准

证书覆盖范围: 水土保持方案编制和水土保持监测及服务

注册地址: 江西省九江市浔阳区环城东路商业街东区 134 号门面

审核地址: 江西省九江市开发区京九路 9 号联盛快乐城 4 号楼 1703 室

颁证日期: 2020 年 09 月 17 日

有效期至: 2023 年 09 月 16 日

初次颁证日期: 2020 年 09 月 17 日

本证书须在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用方有效。本证书有效期 3 年, 每 12 个月内须接受一次监督审核, 并与《年度确认通知书》一起使用方可有效。



证书有效性以左侧二维码扫描内容为准

国家认监委证书查询网址: www.cnca.gov.cn

华标卓越认证(北京)有限公司网址: www.hbrzchina.com


华标卓越认证(北京)有限公司

北京市朝阳区北四环东路106号院5号楼(100029)

中辉学府项目

水土保持监测总结报告责任页

(九江绿野环境工程咨询有限公司)

职责	姓名	职务/职称	签名
批准	周志刚	总经理	
核定	郭 辉	高级工程师	
审查	冯玉宝	高级工程师	
校核	周西艳	助 工	
项目负责人	冷德意	助 工	
编写人员	刘凯兵	助 工	

目录

前言	- 1 -
第 1 章 建设项目及水土保持工作概况	- 6 -
1.1 建设项目概况	- 6 -
1.2 水土保持工作情况	- 11 -
1.3 监测工作实施情况	- 12 -
第 2 章 监测内容和方法	- 19 -
2.1 扰动土地情况	- 19 -
2.2 取料、弃渣	- 19 -
2.3 水土保持措施	- 19 -
2.4 水土流失情况	- 23 -
第 3 章 重点对象水土流失动态监测	- 24 -
3.1 防治责任范围监测	- 24 -
3.2 取料监测结果	- 29 -
3.3 弃渣监测结果	- 29 -
3.4 土石方流向情况监测	- 29 -
3.5 其他重点部位监测结果	- 30 -
第 4 章 水土流失防治措施监测结果	- 34 -
4.1 工程措施监测结果	- 34 -
4.2 植物措施监测结果	- 36 -
4.3 临时措施防治效果	- 39 -
4.4 水土保持措施防治效果	- 41 -

第 5 章 水土流失情况监测 - 43 -

5.1 水土流失面积 - 43 -

5.2 土壤流失量 - 44 -

5.3 取料、弃渣潜在土壤流失量 - 45 -

5.4 水土流失危害 - 46 -

第 6 章 水土流失防治效果监测结果 - 47 -

6.1 水土流失总治理度 - 47 -

6.2 土壤流失控制比 - 47 -

6.3 渣土防护率 - 47 -

6.4 表土保护率 - 48 -

6.5 林草植被恢复率 - 48 -

6.6 林草覆盖率 - 48 -

第 7 章 结论 - 49 -

7.1 水土流失动态变化 - 49 -

7.2 水土保持措施评价 - 49 -

7.3 存在问题及建议 - 50 -

7.4 综合结论 - 51 -

第 8 章 附图及有关资料 - 53 -

8.1 附件附图 - 53 -

8.2 有关资料 - 53 -

前言

中辉学府项目位于九江市濂溪区十里街道九莲北路79号。地理坐标为东经115°59'50.74"，北纬29°40'52.06"。

项目征占地总面积 6.44hm²，全部为永久占地。总建筑面积 160605.40m²，计容建筑面积 122105.40m²，不计容建筑面积 38500m²，建筑密度 30%，容积率 2.0，总绿化面积 3.54hm²，其中场地绿化面积 3.46hm²，边坡绿化 0.08hm²。项目共建设 17 栋高层住宅楼、1 栋高层公寓式酒店、1 栋配套用房、地下室、道路及绿化等配套设施。

项目于 2019 年 7 月开工，2022 年 7 月完工，总工期 37 个月。工程总投资 101325 万元，其中土建投资 71303 万元，资金来源于建设单位自筹。项目共计土石方挖填量为 43.47 万 m³，其中挖方 29.55 万 m³，填方 13.92 万 m³（含表土 1.06 万 m³），借方 1.06 万 m³（含表土 1.06 万 m³），综合利用方 16.69 万 m³。其中场地内清理的建筑垃圾 5.56 万 m³ 由江西中丰建筑工程有限公司负责运至九江市城市管理局许可的滨江东路 188 号德利智能制造产业园消纳点用于综合利用；其他的余方 11.13 万 m³，由江西中丰建筑工程有限公司外运至九江市城西港区江西泰盛纸业有限公司二标段项目用于回填。

本项目建设单位为九江中广置业有限公司，主体工程设计单位为建盟设计集团有限公司，水土保持方案编制单位为九江绿野环境工程咨询有限公司，主体工程施工及水土保持工程施工单位为江西筑信建设集团有限公司，主体工程和水土保持工程监理单位为九江市建设监理有限公司；水土保持工程还处于一年养护期内由施工单位运营及日常管护。

2019 年 7 月，九江市濂溪区发展和改革委员会同意中辉学府项目建设并备案（项目统一代码为：2019-360402-70-03-013578）；

2019 年 7 月，由建盟设计集团有限公司编制完成《中辉学府项目规划建筑设计方案》；

2019 年 9 月，九江中广置业有限公司委托九江绿野环境工程咨询有限公司编制了《中辉学府项目水土保持方案报告书》；九江市濂溪区水利局于 2019 年 9 月 12 日下发了《关于中辉学府项目水土保持方案报告书的批复》（濂水字〔2019〕84 号）。

2019年7月，九江中广置业有限公司委托主体工程监理单位九江市建设监理有限公司开展水土保持设施的监理工作；

为了准确掌握生产建设项目水土流失状况和防治效果，控制工程建设造成的水土流失，指导生产建设项目水土保持工作，为水土保持监督管理和水土保持设施自主验收提供科学依据，九江中广置业有限公司于2019年9月委托我公司承担中辉学府项目水土保持监测工作。

接受委托后，我公司立即组织专业技术人员对该工程基本情况、建设扰动地表情况、水土流失状况、水土保持措施及防治效果等进行了调查和现场监测。2019年9月至2022年7月经过对项目现场长期监测，对监测资料进行整理、汇总和分析，完成了《中辉学府项目水土保持监测总结报告》。

根据建设单位提供的竣工资料和监测结果统计，水土保持方案确定的水土流失防治体系已得到较好的落实，按监测分区各区域内完成的水土保持措施如下：

1、主体工程防治区

实际完成的工程措施有雨水管 2434m，雨水井 96 座，雨水口 192 口，表土回填 10621.2m³，场地东侧边坡防护：坡顶截水沟 262m、坡脚排水沟 247m、格构锚固工程 1585m²，植草沟 1060m；植物措施有场地绿化 31204m²（乔木 1250 株，灌木 640542 株，草坪 13142m²）。南侧绿化带 3400m²（灌木 52380 株，草坪 2110m²）；格构梁内绿化 800m²；临时措施有场地排水沟 1060m，沉沙池 5 座，洗车槽 3 座，基坑排水沟 1040m，集水井 7 个，苫布覆盖 11180m²，临时围挡 2805m。

该项目批复的水土保持总投资为 879.98 万元，实际完成水土保持总投资 939.61 万元，水土保持补偿费 6.44 万元。

水土保持投资发生变化原因：

工程措施减少的原因：工程措施费用减少了 2.67 万元，主要减少了植草砖铺筑的投资。

植物措施增加的原因：实际施工过程中项目区绿化面积较设计增加 0.83hm²，乔木、灌木、草皮都有所增加，且植物单价随年限有所增加，因此增加植物措施费用 133.57 万元。

临时措施增加的原因：临时措施增加了 1.06 万元，主要增加了临时排水沟、

苫布覆盖及临时围挡的投资。独立费用执行情况：独立费用减少了 24.88 万元，主要是优化工程管理；受市场经济影响水土流失监测费减少了 29.94 万元；建设管理费受市场影响增加了 2.63 万元；科研勘察设计费受市场影响增加了 0.71 万元。

水土保持监测特性表

主体工程主要技术指标										
项目名称		中辉学府项目								
建设规模	项目征占地总面积 6.44hm ² ，全部为永久占地。总建筑面积 160605.40m ² ，计容建筑面积 122105.40m ² ，不计容建筑面积 38500m ² ，建筑密度 30%，容积率 2.0，场地绿化面积 3.46 公顷，项目共建设 17 栋高层住宅楼、1 栋高层公寓式酒店、1 栋配套用房、地下室、道路及绿化等配套设施。		建设单位、联系人		九江中广置业有限公司 张利浔 15007924185					
			建设地点		本项目位于九江市濂溪区十里街道九莲北路 79 号。					
			所属流域		长江流域					
			工程概算总投资		101325 万元					
			工程总工期		工程于 2019 年 7 月开工，2022 年 7 月完工，总工期 37 个月。					
水土保持监测指标										
监测单位		九江绿野环境工程咨询有限公司			联系人及电话			冷德意 17707927900		
自然地理类型		项目区属于丘陵地貌，地带性土壤为红壤，地带性植被为亚热带常绿阔叶林。现状地表土壤主要为粉质黏土，成份以建筑垃圾为主，无表土可剥离。原始植被主要为自然恢复的杂草。			防治标准			本项目位于濂溪区，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）要求：位于县级及以上城市区域的生产建设项目，应执行一级标准。因此本项目执行建设类项目一级标准。		
监测内容	监测指标	监测方法（设施）			监测指标			监测方法（设施）		
	1.水土流失状况监测	调查监测			2.防治责任范围监测			调查监测		
	3.水土保持措施情况监测	调查监测			4.防治措施效果监测			调查监测		
	5.水土流失危害监测	调查监测、定位观测			水土流失背景值			1306.53t/km ² •a		
方案设计防治责任范围		6.44hm ²			容许土壤流失量			500t/km ² •a		
水土保持投资		939.61 万元			水土流失目标值			500t/km ² •a		
防治措施		工程措施	雨水管 2434m，雨水井 96 座，雨水口 192 口，表土回填 10621.2m ³ ，场地东侧边坡防护：坡顶截水沟 262m、坡脚排水沟 247m、格构锚固工程 1585m ² ，植草沟 1060m。							
		植物措施	场地绿化 31204m ² （乔木 1250 株，灌木 640542 株，草坪 13142m ² ）。南侧绿化带 3400m ² （灌木 52380 株，草坪 2110m ² ）；格构梁内绿化 800m ² 。							
		临时措施	场地排水沟 1060m，沉沙池 5 座，洗车槽 3 座，基坑排水沟 1040m，集水井 7 个，苫布覆盖 11180m ² ，临时围挡 2805m。							
监测结论	防治效果	分类指标	目标值（%）	达到值（%）	实际监测数量					
		水土流失治理度	98	100	防治措施面积	6.44hm ²	永久建筑物及硬化面积	2.97hm ²	扰动土地总面积	6.44hm ²
		土壤流失	1.0	1.07	防治责任范围面	6.44hm ²	水土流失总		6.44hm ²	

	控制比			积		面积	
	渣土防护率	98	99.27	工程措施面积	0.01	容许土壤流失量	500t/km ² •a
	表土保护率	/		植物措施面积	3.46hm ²	监测土壤流失情况	467t/km ² •a
	林草植被恢复率	98	100	可恢复林草植被面积	3.46hm ²	林草类植被面积	3.46hm ²
	林草覆盖率	27	53.73	实际拦挡土方量 (m ³)	4070	临时堆土量 (m ³)	4100
	水土保持治理达标评价	监测期水土流失治理度, 土壤流失控制比, 渣土防护率, 林草植被恢复率, 林草覆盖率等各项指标达到目标值, 工程建设产生的水土流失得到了基本控制, 扰动和损坏的土地大部分得到了治理, 已实施的防护措施大部分运行良好; 已恢复的植被和绿化植物生长良好, 较好的控制了工程建设所造成的人为水土流失。					
	总体结论	水土保持治理措施基本完成, 防治效果明显, 水保工程建设过程中, 水保方案措施体系, 得到全面落实; 工程进度上遵循了水土流失防治“三同时”的原则, 措施实施进度较方案设计基本一致。					
	主要建议	1、对已建成的水土保持设施加强管护, 保证其正常运行并发挥作用。					

第 1 章 建设项目及水土保持工作概况

1.1 建设项目概况

1.1.1 项目基本情况

中辉学府项目位于九江市濂溪区十里街道九莲北路79号。地理坐标为东经115°59'50.74"，北纬29°40'52.06"。

项目征占地总面积 6.44hm²，全部为永久占地。总建筑面积 160605.40m²，计容建筑面积 122105.40m²，不计容建筑面积 38500m²，建筑密度 30%，容积率 2.0，绿地率 53.73%。项目共建设 17 栋高层住宅楼、1 栋高层公寓式酒店、1 栋配套用房、地下室、道路及绿化等配套设施。

本项目建设单位为九江中广置业有限公司。工程总投资 101325 万元，其中土建投资 71303 万元，资金来源于建设单位自筹。

项目于 2019 年 7 月开工，2022 年 7 月完工，总工期 37 个月。水土保持设施于 2019 年 7 月开工，2022 年 7 月完工，总工期 37 个月。项目共计土石方挖填量为 43.47 万 m³，其中挖方 29.55 万 m³，填方 13.92 万 m³（含表土 1.06 万 m³），借方 1.06 万 m³（含表土 1.06 万 m³），综合利用方 16.69 万 m³。其中场地内清理的建筑垃圾 5.56 万 m³由江西中丰建筑工程有限公司负责运至九江市城市管理局许可的滨江东路 188 号德利智能制造产业园消纳点用于综合利用；其他的余方 11.13 万 m³，由江西中丰建筑工程有限公司外运至九江市城西港区江西泰盛纸业有限公司二标段项目用于回填。

1.1.2 项目区概况

(1) 地形地貌

本项目位于九江市濂溪区九莲北路以东,学院路以南。原始地貌属丘陵地貌,场地起伏较大。原始场地标高介于22.97~53.14m。地表物质组成为建筑垃圾和自然恢复的杂草等。

(2) 地质、地层

引用 2019 年 8 月九江地质工程勘察院编制的《中辉学府岩土工程勘察报告》的内容:

(1) 地质

场地在区域上位于扬子准地台西部的九江台陷构造带与九江-彭泽复向斜南翼的次级皱褶带。九江-德安大断裂(F3)通过勘察区附近(图2),走向NNE、倾向NW、倾角约75°。上述断层断至第三纪地层中,区内第四纪以来,构造活动微弱。场地为丘陵地貌,本次勘察结果表明,场地及周边无滑坡、崩塌、泥石流、地裂缝、地面塌陷等不良地质作用形成的地质环境条件,也未发现上述不良地质作用。

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)附录A我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组,本场地建筑抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计特征周期值为0.35S,设计地震分组为第一组。

据九江地质工程勘察院岩土测试中心岩土工程勘察的波速测试报告结果,据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)土的类型划分和剪切波速范围来确定:钻孔土层等效剪切波速为148.7~303.3m/s属软弱土~中硬土;场地等效剪切波速为258.9m/s,钻孔覆盖层厚度5.00-19.90米,在≥5m范围,属II类场地。综合判定本场地为中硬土II类场地。

本场区地下水类型主要为上层滞水及孔隙裂隙溶洞水,上层滞水主要赋存于填土中;孔隙裂隙溶洞水主要赋存于③卵石及⑤卵石及基岩裂风化隙溶洞中。场地杂填土中卵石较多,钻探中给水钻探,没有测到初见水位;地下水埋深较浅,经钻孔勘察查明场区地下水稳定水位为0.9~2.30m,稳定水位标高为21.59~30.75m。水位变化幅度为1-3米。场地主要含水地层为③卵石及⑤卵石及基岩裂

风化隙溶洞，水量稍丰富；其余地层均为弱含水层。接收大气降雨补给及地下水侧向补给，向南侧排泄。地下水环境为 A 类，地下水类型为 II 类，根据场地的水质分析，该地下水及地基土对砼、砼中钢筋具微腐蚀性。

(2) 地层

本次勘探深度范围内，场地内土层主要为冲洪积成因的粉质粘土、细砂、粗砂、含有机质粉质粘土、含砾粘性土及第三系泥质粉砂岩及灰质砾岩。根据本次勘察揭露，将本场地的土层结构与类型自上而下分述如下：

①人工素填土 (Q^{ml})：黄褐色，松散-稍密，较湿，填料成份主要由粉质粘土及碎石及混凝土碎块砖块等组成，土质疏松，压实性差，堆填时间为 2 年左右。场地大部分分布，揭露厚度 0.50~7.80 米，平均 2.59 米。层底深度为 0.50~7.80 米，平均 2.59 米。

②含有机质粉质粘土 (Q_4^{al})：灰褐色，湿，软塑状，内含有机质，成份主要以粘粒及粉粒组成，局部含少量小砾石，稍具光泽，干强度及韧性中等，有摇晃反应，属高压缩性土。本次仅 ZK28、ZK164 及 ZK166 号钻孔见有。场地小部分分布，揭露厚度 1.40~6.20 米，平均 3.40 米。层底深度为 7.70~17.20 米，平均 11.00 米。

③卵石 (Q_4^{al})：黄褐色，灰褐色，饱和，稍密，粒径大于 20.0mm 的颗粒大于 50%，本层含约占 20%的黏土；卵石含量约占 65%，其余为砂砾，少数大于 20cm，为漂石，卵漂石成份为硅质岩组成，次圆状，分选性较差，属中压缩性土。场地部分分布，揭露厚度 0.60~15.20 米，平均 6.04 米。层底深度为 1.90~18.30 米，平均 8.67 米。

④粉质粘土 (Q_3^{al})：灰褐色，黄褐色，红褐色，湿，硬塑状为主，局部灰褐为可塑，成份主要以粘粒及粉粒组成，局部含少量砾石，砾石粒径一般 2-20mm，少数大于 20mm，稍具光泽，干强度及韧性中等，无摇晃反应，属中-低压缩性土。场地大部分分布，揭露厚度 0.50~17.20 米，平均 4.24 米。层底深度为 1.90~30.30 米，平均 8.78 米。

⑤卵石 (Q_2^{al})：黄褐色，灰褐色，饱和，中密，粒径大于 20.0mm 的颗粒大于 50%，本层含约占 20%的黏土；卵石含量约占 65%，其余为砂砾，少数大于 20cm，为漂石，卵漂石成份为硅质岩组成，次圆状，分选性较差，属中~低压

缩性土。场地大部分分布，揭露厚度 0.50~18.30 米，平均 6.74 米。层底深度为 3.00~31.10 米，平均 12.57 米。

⑥砂质粘性土 (Q_1^{cl})：灰白色，湿，可塑状，由花岗岩风化残积而成，原岩残余结构仍清晰可辨，成份主要以粘粒及粉粒组成，内含少量细砂，稍具光泽，干强度及韧性中等，无摇晃反应，属中压缩性土，本层遇水易软化。场地小部分分布，揭露厚度 2.40~22.40 米，平均 10.88 米。层底深度为 9.80~26.20 米，平均 16.29 米。

⑦-1 全风化花岗岩 (J_3)：灰黄，褐黄色，原岩组织结构破坏严重，矿物成分显著变化，岩石风化强烈，局部风化呈黏土状，岩芯一般碎块，极软岩，V级， $RQD=0$ 。无洞穴、临空面、破碎岩体、软弱岩层等存在。本次遇水易软化。场地小部分分布，揭露厚度 0.50~2.60 米，平均 1.63 米。层底深度为 13.10~27.40 米，平均 19.08 米。

⑦-2 强风化花岗岩 (J_3)：灰黄，褐黄色，原岩组织结构大部分破坏，矿物成分显著变化，岩石风化较强烈，手折可断，岩芯一般块状，极软岩，V级， $RQD=0$ 。无洞穴、临空面、破碎岩体、软弱岩层等存在。场地部分分布，揭露厚度 0.50~12.30 米，平均 3.50 米。层底深度为 14.00~28.00 米，平均 21.09 米。

⑦-3 中风化花岗岩 (J_3)：灰黄，黄褐色，原岩主要由长石、石英、云母等组成。粗粒花岗结构，块状构造，节理、裂隙较发育，岩体短柱状及块状，较软岩，IV级， $RQD=56$ 。无洞穴、临空面、破碎岩体、软弱岩层等存在。场地小部分分布，揭露厚度 3.30 米，平均 3.30 米。层底深度为 25.00 米，平均 25.00 米。

⑧-1 强风化石灰岩 (T_3)：青灰色，夹灰白色，原岩结构及构造较清晰，隐晶质结构，节理裂隙发育，岩体破碎，局部风化呈黏土状，岩芯一般块状，极软岩，V级， $RQD=0$ 。无洞穴、临空面、破碎岩体、软弱岩层等存在，但有溶洞存在。本场区仅部分钻孔揭露到，场地部分分布，揭露厚度 0.10~11.80 米，平均 1.07 米。层底深度为 3.30~30.90 米，平均 13.20 米。

⑧-2 中风化石灰岩 (T_3)：青灰色，夹灰白色，原岩结构及构造清晰，主要矿物成份为碳酸盐矿物，隐晶质结构，中-厚层状构造，节理裂隙发育，可见方解石脉，岩体较破碎，岩芯一般呈柱状及块状，较硬岩，IV级， $RQD=33$ 。无临空面、破碎岩体、软弱岩层等存在，但有溶洞存在。因钻探深度所限，本场区仅

部分钻孔揭露到，场地部分分布，揭露厚度 0.10~13.10 米，平均 2.72 米。层底深度为 8.00~22.10 米，平均 15.45 米。

⑨溶洞：无充填溶洞、半充填溶洞及全充填溶洞均有。场地风化的灰岩中有溶洞，溶洞中部分充填软塑状黄褐色含砾粘性土。62个钻孔见溶洞82个，钻孔溶洞见有率为36.9%，详见溶洞分布一览表。另外场地东测及西侧发现有二条南北向的防空洞，防空洞外口出露，施工时应重视。

（3）土壤、植被

本项目区地带性土壤为红壤，根据项目岩土工程勘察报告及现场勘察，项目场地内现表层土壤为粉质黏土，成份以建筑垃圾为主，无表土可剥离，成土母质为粉质黏土。根据项目地质勘查报告中土工试验内容分析，本项目土壤理化性质相对于标准值，土壤孔隙度大，含水量大，容重大，易产生水土流失。

项目区地带性植被为亚热带常绿阔叶林，根据项目开工前卫星影像图分析，现状植被主要为自然恢复的杂草，植被覆盖率为34.7%。水土流失强度为中度。区域内乡土树种有樟树、广玉兰、马尾松、湿地松等乔木，红花檵木、冬青、杜鹃等灌木，狗牙根、麦冬等草种。

（4）气象、水文

①气象

本项目引用九江市气象局1960至2010年统计资料：本项目所在地濂溪区属亚热带湿润季风气候区，气候温和，四季分明，光照充足，雨量充沛、无霜期长。多年平均气温18.5℃，极端最低气温-9.7℃（1969年2月6日），极端最高温度40.9℃（1961年7月23日），最高月平均气温28.92℃，最低月平均气温4.22℃，年平均降雨量1430mm，降雨量年际变化大，1954年雨量达2165.7mm，1978年雨量仅867.7mm。降水量年内分配不均，年降水的40%-50%集中在4-6月。暴雨主要发生在4-9月，以6月和7月发生暴雨的几率最多，日最大降雨量122.4mm。4-6月多为锋面雨，一次暴雨历时一般在4-5天，最长的可达10天以上，实测最大一日暴雨为248.6mm，年均蒸发量1032.5mm。10年一遇24h最大降雨量为163mm，20年一遇24h最大降雨量为192mm。全年日照充足，太阳辐射的年总量在102.3-114.1千卡/cm²，日照时数为1650-2100小时。年无霜期239-266天，年平均湿度达75%-80%，≥10℃有效积温5395℃。全年以东北风为主，冬季主导风向北向，年

大风天数13.8d, 年平均风向北向, 年平均风速2.9m/s, 瞬时极大风速29.4m/s。

②水文

(1) 周边水系

项目所在地属长江流域, 周边水系为濂溪河和十里河。以下引自《九江市水功能区划》。

十里河位于九江庐山区境内十里城区, 是八里湖的一条支流, 发源于庐山北坡, 由庐山濂溪水系和莲花洞水系交汇而成, 河流自南向北流经庐山区、九江经济技术开发区, 在九江职业技术学院于濂溪河交汇后改道向西汇入八里湖, 全流域面积 47.12km² (本次采用 1:1 万航测图量算), 其中莲花大道以上 6.65km²。十里河主河道上游由姚溪河 (市 5727 厂支流)、龙锡河 (庐山莲花洞水系主支) 于市仪表厂汇合而成, 从分水岭至十里河口全长 13.08km, 河道加权平均坡降为 18.81‰。十里河上游、天然流域外分布有小 (一) 水库 1 座, 为梅山水库, 小 (二) 型水库 2 座, 为向阳水库和红灯水库 (又名蛇头岭水库), 流域内有山塘 1 座, 为殷家龙水库。

濂溪河为十里河一级支流, 集水面积 18.32km², 河流全长 9.62km, 该段设计洪水位 24.41~24.46m。

(5) 项目区水土流失情况

项目区地处南方红壤丘陵侵蚀区, 水土流失类型主要以地表径流冲刷引起的水力侵蚀为主, 容许土壤流失量为 500t/(km²·a)。

通过项目区水土流失调查, 项目区现有水土流失面积总计 6.44hm², 占项目征占地总面积的 100%, 根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》, 确定平均土壤侵蚀模数为 1306.53t/(km²·a), 年土壤侵蚀总量为 84.14t/a。水土流失强度为轻度侵蚀。

1.2 水土保持工作情况

2019 年 9 月, 九江中广置业有限公司委托九江绿野环境工程咨询有限公司编制了《中辉学府项目水土保持方案报告书》; 九江市濂溪区水利局于 2019 年 9 月 12 日下发了《关于中辉学府项目水土保持方案报告书的批复》(濂水字[2019] 84 号)。

2019年9月，建设单位委托九江绿野环境工程咨询有限公司对本项目开展水土保持监测工作，2022年7月完成水土保持监测工作，于2022年7月编制完成《中辉学府项目水土保持监测总结报告》。

2022年7月，建设单位委托九江绿野环境工程咨询有限公司准备验收工作，编制水土保持设施验收报告。

1.3 监测工作实施情况

1.3.1 监测实施方案执行情况

重点对主体工程实施过程中及措施实施后进行监测，对开挖回填、扰动面积、土石方量、植物措施、工程措施展开调查监测，运行期植被固土保水能力监测。在监测过程中，针对项目现场存在的问题向业主建议。执行了水土保持方案确定的目标、计划及任务。

监测时段：2019年9月至2022年7月，共35个月。

（一）准备阶段：2019年9月为第一时段，组建监测工作组，收集项目建设区气象、水文资料，有关工程设计资料，地形图和有关工程设计图，开展各区面积调查监测、扰动类型侵蚀强度监测及监测设施（点）布设。

（二）实施阶段：2019年10月至2022年6月，向九江市濂溪区水利局递交水土保持监测实施方案1份，水土保持监测季度报告表11份。同时进行基本扰动类型侵蚀强度、土石方调查监测，完善各区面积监测及防治措施调查。

（三）分析评价阶段：2022年6-7月为第三时段，重点进行植物措施监测，植被保水保土能力监测等，完成监测报告。

水土保持监测记录表

表 1.3-1

监测时间	频次	监测内容	备注
2019年9月	2	合同签订后，到工程建设区全面了解情况，明确监测范围及重点监测区域	
2019年10月至 2022年7月	34	到现场进行各区面积及防治措施调查，重点进行植物措施面积的监测。	
		到现场进行各区面积及防治措施调查，重点进行防治措施调查和侵蚀强度监测。	
		到现场进行各区面积及防治措施调查，准备验收工作。	
		到现场进行各区面积及防治措施、成活率调查，准备验收工作。	
		编制监测总结报告。	

1.3.2 监测组设置

接受委托后，我公司立即组织专业技术人员组建项目水土保持监测项目部，配备相关水土保持专业人员四名，分为监测项目负责人、外业监测工程师、内业工程师（数据文档处理人员）等。各自职责为：

（1）监测项目负责人：全面负责项目的监测工作，为合同履行的总负责人，在项目完工后对项目施工人员进行安全、质量技术交底。

（2）外业监测工程师：野外监测工作实施、测量、记录等具体工作。

（3）内业工程师：数据录入、处理监测数据兼文字录入工作，数据的处理分析以及各项报告的编写工作对该工程基本情况、建设扰动地表情况、水土流失状况、水土保持措施及防治效果等进行了调查和现场监测。

表 1.3-2 监测部成员表

序号	姓 名	职 责	工 作 内 容
1	冷德意	项目负责人	项目实施、项目组织
2	顾千潘	外业监测工程师	水土流失影响因子监测、调查监测。
3	杨敏	内业工程师	制图、数据处理和录入、报告的编写工作
4	周西艳	内业工程师	制图、数据处理和录入、报告的编写工作

1.3.3 监测点布设

1.3.3.1 工程措施监测点

工程措施监测点根据工程措施设计的数量、类型和分布情况，结合现场调查进行布设。监测工作组对项目区内已完成工程措施进行监测，于 2022 年 3-7 月选取项目区内雨水口、雨水井及边坡防护为本项目工程措施调查监测点，经现场监测得知，雨水口、雨水井及边坡防护运行情况良好。



 2022年第三季度边坡防护情况	 2022年第三季度边坡防护情况
 2022年第三季度雨水井运行情况	 2022年第二季度雨水井运行情况
排水沟、沉沙池运行情况	
工程措施调查监测点雨水井雨水口 位置为主体工程区防治区内 防洪排导工程运行良好 水土流失情况得到全部控制	

1.3.3.1 植物措施监测点

监测工作组进场后，对项目区内绿化区域进行监测，于2021年6月至2022年7月分别进行布点监测，采取调查监测法。

2021年6月至2022年7月期间，分别选取监测区域不规则形状约4-25m²不等作为样地单位，经监测工作组监测发现项目区范围内草坪成活率达98%，保存率99%，生长情况良好，通过监测发现，对比监测区域内，其水土保持效果明显，满足植被恢复率要求。已全部复绿，生长情况良好。

监测工作组对植物措施中的草坪、乔、灌木进行了监测。

2022年7月，项目区内植物措施已全面完工，主要为铺植草坪；种植乔、灌木等。监测工作组选择了2m×2m草坪、1m×25m乔木、2m×2m灌木方样进行

了监测，通过监测发现，对比监测区域内，其水土保持效果明显，满足植被恢复率要求。已全部复绿，生长情况良好。



2021 年第二季度植物措施调查监测点




2021 年第三季度植物措施调查监测点



2021 年第一季度植物措施调查监测点




2021 年第三季度植物措施调查监测点

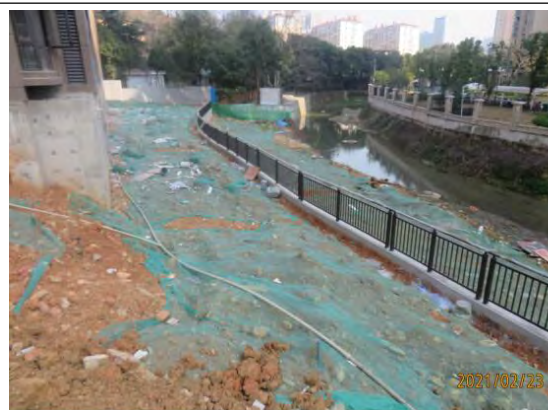

2021 年第一季度植物措施调查监测点



2021 年第三季度植物措施调查监测点

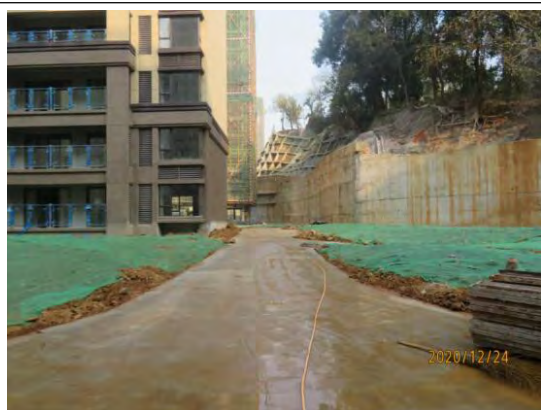

2020 年第四季度植物措施调查监测点



2021 年第三季度植物措施调查监测点



2021 年第四季度植物措施调查监测点



2022 年第二季度植物措施调查监测点



2021 年第四季度植物措施调查监测点



2022 年第二季度植物措施调查监测点



2021 年第四季度植物措施调查监测点



2022 年第三季度植物措施调查监测点



1.3.4 监测设施设备

监测所需设备和材料有钢钎、油漆、土钻、环刀等采样设备，天平、烧杯、量杯、烘箱等样品分析设备，标杆、50m 皮尺、钢卷尺等测量设备以及数码相机、数码摄像机、水准仪、坡度仪、经纬仪、手持式 GPS 定位仪及无人机等调查监测设备。

1.3.5 监测技术方法

监测方法主要采用调查监测法、巡查法及无人机技术。施工中应及时调查由

于施工造成水土流失的危害，沟道淤积等情况，并预测其发展趋势。

对影响水土流失的主要因子如地形、地貌、水系、水土流失的危害、生态环境的变化以及水土保持方案实施等情况采用调查监测。

根据项目建设区进度及现状，对绿化工程建设的相关部位采取巡测的办法开展水土流失的监测工作。

项目建设对周边产生水土流失危害情况，采用无人机技术实施监测，全面的获悉周边的影响情况；利用无人机的大视角摄影能力系统的规划水土保持监测体系。

1.3.6 监测成果提交情况

项目共提交中辉学府项目水土保持监测记录表 35 份，水土保持监测实施方案 1 份，水土保持监测季度报告表 11 份等。

表 1.3-4 监测成果提交情况表

序号	项目	提交时间	提交对象	主要内容	备注
1	水土保持监测实施方案	2019 年 9 月	水行政主管部门、建设单位	监测实施方案	1
2	监测记录表	2019 年 9 月至 2022 年 7 月	建设单位	月监测情况及意见	35
3	水土保持监测季度报告表	2020 年 10 月至 2022 年 6 月	水行政主管部门、建设单位	季度报告表	11

第 2 章 监测内容和方法

2.1 扰动土地情况

扰动土地情况通过扰动地表面积，结合施工图按季度进行统计调查监测得出。监测工作组于 2019 年 9 月进场开展监测工作，至 2022 年 7 月进行总结，根据水土保持设施施工时段，于 2022 年 7 月结束监测工作。

项目于 2019 年 7 月开工，2022 年 7 月完工，总工期 37 个月。监测时段接受委托开始为 2019 年 9 月至 2022 年 7 月，共 35 个月。

通过现场长期监测、调查资料及查阅相关历史影像资料得知，扰动土地最为严重时段为 2019 年 9 月至 2021 年 6 月主要为土方工程、基础开挖，扰动土地面积为 6.44hm²，也是建设过程中产生水土流失最为严重的时期。

项目建设扰动土地情况基本控制在红线范围内，主体工程完工后主要为水土保持设施小区域的扰动面积，水土保持设施施工扰动土地总面积 3.46hm²。

2.2 取料、弃渣

根据《中辉学府项目水土保持方案报告书》及批复文件本项目未设置取料、弃渣场。根据查阅相关结算资料，工程实际施工过程中产生共计土石方挖填量为 43.47 万 m³，其中挖方 29.55 万 m³，填方 13.92 万 m³（含表土 1.06 万 m³），借方 1.06 万 m³（含表土 1.06 万 m³），综合利用方 16.69 万 m³。其中场地内清理的建筑垃圾 5.56 万 m³由江西中丰建筑工程有限公司负责运至九江市城市管理局许可的滨江东路 188 号德利智能制造产业园消纳点用于综合利用；其他的余方 11.13 万 m³，由江西中丰建筑工程有限公司外运至九江市城西港区江西泰盛纸业有限公司二标段项目用于回填。

2.3 水土保持措施

水土保持措施主要包括工程措施、植物措施。监测工作组分别设置了工程措施监测点、植物措施监测点。通过监测及查阅相关资料发现，水土保持措施施工时间与主体工程紧密相连，不同时段采取不同的水土保持防治措施。

遥感监测

1) 卫星遥感监测通过获取项目区监测时段内的高分辨率卫星遥感影像，基于 RS 与 GIS 技术，对获取的遥感影像依次开展正射校正、专题信息增强、影像

配准、影像融合、影像镶嵌等处理，采用目视判读解译方法，解译获取项目建设各阶段的扰动范围、水土保持措施实施进度、水土流失面积等动态监测数据。

2) 无人机低空遥感监测 无人机低空摄影测量技术是一种高精度的现代摄影测量方法。利用无人机平台获取的原始数据，经影像后处理软件处理后，获得项目区的数字高程模型 (DEM) 和数字正射影像图 (DOM)，以 DEM 和 DOM 数据为基础，结合项目区平面布置图，绘制各分区边界线，可精确计算各监测分区扰动土地面积；通过提取植被覆盖度、土地利用类型和坡度等水土流失影响因子，进而判别各监测分区的土壤侵蚀强度；通过对比两期 DEM 数据，可以计算取弃土场的方量；通过影像解译并辅以野外调查，可获得水土保持工程、植物措施的实施面积。

水土保持措施对主体工程安全建设和运行发挥的作用和水土保持措施对周边水土保持生态环境发挥的作用采用巡查监测，每年汛期前后及大风、暴雨后进行调查。本工程水土保持措施的实施效果监测主要采用地面观测、实地量测和资料分析的监测方法。水土保持工程措施和临时防护措施监测包括实施进度、位置、规格、尺寸、数量、质量、稳定性、完好率、运行情况 and 拦渣保土效果。水土保持植物措施监测包括实施进度、不同阶段的林草种植面积、成活率、生长情况、林草覆盖度、郁闭度、拦渣保土效果和扰动地表林草自然恢复情况等。

经调查监测反映方案设计的措施体系合理性，确定的水土保持措施已得到较全面落实。完成的植物措施和自然恢复的植被较好的防治了因工程引发的人为水土流失。

根据建设单位提供有关资料得知，完成的水土保持措施量如下表 2.3-1，主要采取的调查监测方法，结合监测点的布置取得监测数据。

水土保持措施监测情况表

表 2.3-1

序号	工程名称	开工与完工时间	位置	数量	郁闭度	防治效果	运行状况	监测频次	监测方法
	工程措施								
1	雨水管	2021 年 8 月至 2022 年 3 月	主体工程防治区	2485m				18	调查监测
2	雨水井			98 座				18	调查监测
3	雨水口			196 个				18	调查监测
4	表土回填			10621.2m ³				18	调查监测
5	场地东侧边坡防护			1585m ²				18	调查监测
6	植草沟			1060m				18	调查监测
二	植物措施								
1	场地绿化	2021 年 8 月至 2022 年 7 月	主体工程防治区	31204m ²	0.8	良好	良好	22	调查监测
1.1	乔木			1250 株	0.7	良好	良好	22	调查监测
1.2	灌木			640542 株	0.9	良好	良好	22	调查监测
1.3	草坪			13142m ²	0.9	良好	良好	22	调查监测
2	南侧绿化带			3400m ²	0.8	良好	良好	22	调查监测
2.1	灌木			52380 株	0.7	良好	良好	22	调查监测
2.2	草坪			2110m ²	0.9	良好	良好	22	调查监测
3	格构梁内绿化			800m ²	0.8	良好	良好	22	调查监测
三	临时措施								
1	场地排水沟	2019 年 7 月至	主体工程防治区	1060m		良好	良好	35	调查监测
2	沉砂池	2022 年 7 月		5 座		良好	良好	35	调查监测

3	洗车槽			3 座		良好	良好	35	调查监测
4	基坑排水沟			1040m		良好	良好	35	调查监测
5	集水井			7 座		良好	良好	35	调查监测
6	苫布覆盖			11180m ²		良好	良好	35	调查监测
7	临时围挡			2805m		良好	良好	35	调查监测

2.4 水土流失情况

监测时段为 2019 年 9 月至 2022 年 7 月，共 37 个月。监测组随着水土保持工程进展情况的变化，项目区部分地表扰动面积随之改变，至监测委托时间起，项目主体工程正在施工过程中。施工过程中的水土流失面积情况按施工时序和进度进行分析推算。

详见下表 2.4-1、2.4-2、2.4-3 水土流失情况记录表。

施工期监测区水土流失情况表（开挖及回填区域）

表 2.4-1

监测分区	项目建设区面积 (hm ²)	水土流失面积占用地面积 (%)	水土流失面积 (hm ²)	各级水土流失面积 (hm ²)			平均土壤侵蚀模数 t/(km ² ·a)	年均土壤侵蚀总量 (t)
				轻度	中度	强烈		
主体工程防治区	6.44	100	6.44			6.44	9225	594.09
合计	6.44	100	6.44			6.44	9225	594.09

施工期监测区水土流失情况表（临时堆存区域）

表 2.4-2

监测分区	项目建设区面积 (hm ²)	水土流失面积占用地面积 (%)	水土流失面积 (hm ²)	各级水土流失面积 (hm ²)			平均土壤侵蚀模数 t/(km ² ·a)	年均土壤侵蚀总量 (t)
				轻度	中度	强烈		
主体工程防治区	6.44	3.1	0.20		0.20		4604	9.21
合计	6.44	3.1	0.20		0.20		4604	9.21

试运行期监测区水土流失情况表

表 2.4-3

监测分区	项目建设区面积 (hm ²)	水土流失面积占用地面积 (%)	水土流失面积 (hm ²)	各级水土流失面积 (hm ²)			平均土壤侵蚀模数 t/(km ² ·a)	年均土壤侵蚀总量 (t)
				轻度	中度	强烈		
主体工程防治区	6.44	/	/	/	/	/	467	/
合计	6.44	/	/	/	/	/	467	/

第3章 重点对象水土流失动态监测

3.1 防治责任范围监测

3.1.1 水土流失防治责任范围

根据《中辉学府项目水土保持方案报告书》及批复文件，确定的防治责任范围为 6.44hm²。项目防治分区划分为 1 个水土流失防治区，即主体工程防治区。

通过 2019 年 9 月至 2022 年 7 月现场监测及无人机遥感监测等监测手段得知，项目建设过程中无超范围扰动，实际扰动范围均控制在红线范围内，面积为 6.44hm²。

综上所述，方案批复的水土流失防治责任范围较实际监测得知水土流失面积一致，无变化。详见表 3.1-1、3.1-2。

方案批复防治责任范围表

表 3.1-1

单位：hm²

项目	水土流失防治区	项目建设区	合计
中辉学府项目	主体工程防治区	6.44	6.44
合计		6.44	6.44

监测确定防治责任范围表

表 3.1-2

单位：hm²

项目	水土流失防治区	项目建设区	合计
中辉学府项目	主体工程防治区	6.44	6.44
合计		6.44	6.44



水土流失防治责任范围监测影像（2019 年 9 月）



水土流失防治责任范围监测影像（2022 年 7 月）

3.1.2 背景值及各地表扰动类型侵蚀模数

(1) 原地貌侵蚀模数

通过项目区水土流失调查，项目区现有水土流失面积总计 6.44hm^2 ，占项目征占地总面积的 100%，根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》，确定平均土壤侵蚀模数为 $1306.53\text{t}/(\text{km}^2\cdot\text{a})$ ，年土壤侵蚀总量为 84.14t/a 。水土流失强度为轻度侵蚀。

(2) 防治措施实施后侵蚀模数

监测项目组通过查阅设计资料、监理月报、工程验收计量单、现场调查及卫星遥感影像等方法对项目区内实施措施完成后，施工临时堆土，构、建物基础开挖及回填的三个侵蚀单元上的 3 组监测点的数据进行采集、整理与分析，计算结果见表 3.1-2，3.1-3，3.1-4。

根据以上监测数据分别计算有植物措施区域、施工临时堆土，构、建物基础开挖及回填的侵蚀模数，结果见表 3.1-5，3.1-6，3.1-7。

根据以上监测数据，计算得出 2019 年 9 月至 2022 年 7 月本项目扰动地表在水土保持设施逐步实施完毕后初步发挥效益时的平均土壤侵蚀模数为 $473\text{t}/(\text{km}^2\cdot\text{a})$ 。有植被覆盖的地表比尚未恢复植被的地表流失量明显减少，水土保持设施保水拦渣防护效果显著。

表 3.1-2 测针法测定有植被区域土壤流失量登记表

组别	2021 年 8 月至 2022 年 7 月侵蚀厚度 (mm)		备注
	第一组	第二组	
标桩 1	0.39	0.40	水力侵蚀量
标桩 2	0.38	0.39	水力侵蚀量
标桩 3	0.38	0.40	水力侵蚀量
标桩 4	0.39	0.40	水力侵蚀量
标桩 5	0.40	0.39	水力侵蚀量
标桩 6	0.39	0.39	水力侵蚀量
标桩 7	0.39	0.40	水力侵蚀量
标桩 8	0.38	0.38	水力侵蚀量
标桩 9	0.38	0.39	水力侵蚀量
平均侵蚀厚度	0.38	0.39	$H_{\text{平均}} = \sum h$
坡度 (°)	25	25	
容重 (t/m^3)	1.35	1.35	测定值
侵蚀量 (t)	0.0004617	0.0004738	$A = pZS/1000\cos\theta$

表 3.1-3 测针法测定临时堆土区域土壤流失量登记表

组别	2019 年 9 月至 2021 年 6 月侵蚀厚度 (mm)		备注
	第一组	第二组	
标桩 1	3.9	4.1	水力侵蚀量
标桩 2	3.9	4.1	水力侵蚀量
标桩 3	4.0	3.9	水力侵蚀量
标桩 4	3.8	4.0	水力侵蚀量
标桩 5	4.0	4.0	水力侵蚀量
标桩 6	3.9	4.1	水力侵蚀量
标桩 7	3.9	4.0	水力侵蚀量
标桩 8	4.0	3.9	水力侵蚀量
标桩 9	3.9	4.1	水力侵蚀量
平均侵蚀厚度	3.9	4.0	$H_{\text{平均}} = \sum h$
坡度 (°)	30	30	
容重 (t/m^3)	1.34	1.34	测定值
侵蚀量 (t)	0.0045466	0.0046632	$A = \rho ZS / 1000 \cos \theta$

表 3.1-4 测针法测定开挖回填区域土壤流失量登记表

组别	2019 年 9 月至 2020 年 8 月侵蚀厚度 (mm)		备注
	第一组	第二组	
标桩 1	7.5	7.7	水力侵蚀量
标桩 2	7.6	7.7	水力侵蚀量
标桩 3	7.6	7.6	水力侵蚀量
标桩 4	7.7	7.8	水力侵蚀量
标桩 5	7.7	7.6	水力侵蚀量
标桩 6	7.6	7.7	水力侵蚀量
标桩 7	7.6	7.6	水力侵蚀量
标桩 8	7.7	7.8	水力侵蚀量
标桩 9	7.6	7.7	水力侵蚀量
平均侵蚀厚度	7.6	7.7	$H_{\text{平均}} = \sum h$
坡度 (°)	25	25	
容重 (t/m^3)	1.34	1.34	测定值
侵蚀量 (t)	0.0091656	0.0091656	$A = \rho ZS / 1000 \cos \theta$

(3) 各地表扰动类型侵蚀模数

通过查阅设计资料、监理月报、工程验收计量单、现场调查及卫星遥感影像等方法及以上监测数据分别计算项目区扰动地表开挖回填、临时堆土、绿化三类不同侵蚀单元的侵蚀模数，计算结果见表 3.1-5，3.1-6，3.1-7 土壤侵蚀模数计算表。

侵蚀模数是土壤侵蚀强度单位，是衡量土壤侵蚀程度的一个量化指标。也称为土壤侵蚀率、土壤流失率或土壤损失幅度。指表层土壤在自然营力（水力、风力、重力及冻融等）和人为活动等的综合作用下，单位面积和单位时间内被剥蚀并发生位移的土壤侵蚀量；其单位为 $t/(km^2 \cdot a)$ 。也可采用单位时段内的土壤侵蚀厚度，其单位名称为毫米每年（ mm/a ）。土壤侵蚀模数与土壤侵蚀厚度的换算关系为：土壤侵蚀厚度=土壤侵蚀模数/土壤容重，容重单位为 g/cm^3 或 t/m^3 ）。

表 3.1-5 测针法测定有植被区域土壤侵蚀模数计算表

组 别	2021 年 8 月至 2022 年 7 月		备注
	第一组	第二组	
平均厚度（mm）	0.38	0.39	H 平均= $\sum h$
坡度（.）	25	25	
容重（ t/m^3 ）	1.35	1.35	测定值
侵蚀量（t）	0.0004617	0.0004738	$A=ZScos\theta/1000$
侵蚀模数（ $t/km^2 \cdot a$ ）	461	473	水力侵蚀量
侵蚀模数平均值	467		水力侵蚀量

表 3.1-6 测针法测定临时堆土土壤侵蚀模数计算表

组 别	2019 年 9 月至 2021 年 6 月		备注
	第一组	第二组	
平均厚度（mm）	3.9	4.0	H 平均= $\sum h$
坡度（.）	30	30	
容重（ t/m^3 ）	1.34	1.34	测定值
侵蚀量（t）	0.0045466	0.0046632	$A=ZScos\theta/1000$
侵蚀模数（ $t/km^2 \cdot a$ ）	4546	4663	水力侵蚀量
侵蚀模数平均值	4604		水力侵蚀量

表 3.1-7 测针法测定扰动地表开挖回填土壤侵蚀模数计算表

组 别	2019 年 9 月至 2020 年 8 月		备注
	第一组	第二组	
平均厚度（mm）	7.6	7.7	H 平均= $\sum h$
坡度（.）	25	25	

容重 (t/m^3)	1.34	1.34	测定值
侵蚀量 (t)	0.0091656	0.0092862	$A=ZScos\theta/1000$
侵蚀模数 ($t/km^2 \cdot a$)	9165	9286	水力侵蚀量
侵蚀模数平均值	9225		水力侵蚀量

根据以上扰动地表监测点数据,发现各种扰动地表类型中,开挖回填类扰动造成的侵蚀最大,平均侵蚀模数为 $9225t/(km^2 \cdot a)$,临时堆土扰动次之,为 $4604t/(km^2 \cdot a)$,绿化扰动相对最小为 $467t/(km^2 \cdot a)$ 。

3.1.3 建设期扰动土地面积

根据本工程征占地资料 and 实际调查核实,本工程建设期间实际扰动土地面积为 $6.44hm^2$,占地类型为空闲地,其中永久占地 $6.44hm^2$ 。

3.2 取料监测结果

根据《中辉学府项目水土保持方案报告书》(报批稿)及批复文件,本项目不设置取料场。外借土石方由施工单位统一负责外购。

3.3 弃渣监测结果

根据《中辉学府项目水土保持方案报告书》及批复文件本项目未设置弃渣场。根据现场长期监测及查阅相关资料得知,实际施工过程中综合利用方 16.69 万 m^3 。其中场地内清理的建筑垃圾 5.56 万 m^3 由江西中丰建筑工程有限公司负责运至九江市城市管理局许可的滨江东路 188 号德利智能制造产业园消纳点用于综合利用;其他的余方 11.13 万 m^3 ,由江西中丰建筑工程有限公司外运至九江市城西港区江西泰盛纸业有限公司二标段项目用于回填。

3.4 土石方流向情况监测

3.4.1 方案设计土石方量

根据《中辉学府项目水土保持方案报告书》及批复文件,本工程土石方挖填量为 41.86 万 m^3 ,其中挖方 28.32 万 m^3 ,填方 13.54 万 m^3 (含表土 0.79 万 m^3),借方 0.79 万 m^3 (含表土 0.79 万 m^3),综合利用方 15.57 万 m^3 。

借方由施工单位统一负责外购。

本项目场地内清理的余土 5.56 万 m^3 由江西中丰建筑工程有限公司负责运至九江市城市管理局许可的滨江东路 188 号德利智能制造产业园消纳点用于综合

利用。

3.4.2 实际监测土石方情况

根据现场长期监测及查阅相关结算资料,工程实际施工过程中产生共计土石方挖填量为 43.47 万 m^3 ,其中挖方 29.55 万 m^3 ,填方 13.92 万 m^3 (含表土 1.06 万 m^3),借方 1.06 万 m^3 (含表土 1.06 万 m^3),综合利用方 16.69 万 m^3 。其中场地内清理的建筑垃圾 5.56 万 m^3 由江西中丰建筑工程有限公司负责运至九江市城市管理局许可的滨江东路 188 号德利智能制造产业园消纳点用于综合利用;其他的余方 11.13 万 m^3 ,由江西中丰建筑工程有限公司外运至九江市城西港区江西泰盛纸业有限公司二标段项目用于回填。

根据建设单位提供的有关结算资料,方案设计土石方与实际工程量略有变化,其中挖方增加 1.23 万 m^3 ,西侧和北侧边坡采取了场地平整,增加了挖方量;增加了场地绿化面积,填方量增加 0.38 万 m^3 。(详见土石方结算清单)土石方平衡及调配情况详见表 3-3。

土石方平衡表

表 3-3

单位: 万 m^3

序号		挖方	填方	借方		余方	
				数量	来源	数量	去向
①	设计	28.32	13.54	0.79	外购	15.57	滨江东路 188 号德利智能制造产业园消纳点用于综合利用
②	实际	29.55	13.92	1.06	外购	16.69	用于九江市城西港区江西泰盛纸业有限公司二标段项目用于回填
增减情况“+”“-”		+1.23	+0.38	+0.27	/	+1.12	

3.5 其他重点部位监测结果

建设单位于 2019 年 9 月委托我单位进行水土保持监测,监测工作小组进场后,对项目区内地下室开挖、回填及施工道路区域进行重点监测,实际监测过程中,建设单位对项目区内地下室开挖、回填及施工道路区域采取了相关措施进行防护,至 2022 年 7 月,项目区各项水土保持措施运行情况良好。





(施工过程中开挖及临时堆土重点监测部位)



(2019年12月主体工程区现状航测)



(2022年7月项目水土保持设施完成情况)

第4章 水土流失防治措施监测结果

4.1 工程措施监测结果

4.1.1 方案设计的工程措施

根据《中辉学府项目水土保持方案报告书》（报批稿），方案设计的工程措施按各防治分区进行布设，主要有：

（1）主体工程防治区

方案设计的工程措施有雨水管 2434m，雨水井 96 座，雨水口 192 口，表土回填 7886.46m³，场地东侧边坡防护：坡顶截水沟 259m、坡脚排水沟 245m、格构锚固工程 1500m²。植草砖铺设 4261 块，植草沟 1058.54m。

4.1.2 工程措施监测结果

本工程水土保持工程措施主要为 2021 年 8 月至 2022 年 3 月实施。通过查阅设计资料、监理月报、工程验收计量单、现场调查及卫星遥感影像复核等方法获取工程措施工程量，局部区域的调查采用无人机调查，已实施的水土保持工程措施如下：

（1）主体工程防治区

完成的工程措施有雨水管 2434m，雨水井 96 座，雨水口 192 口，表土回填 10621.2m³；场地东侧边坡防护：坡顶截水沟 262m、坡脚排水沟 247m、格构锚固工程 1585m²；植草沟 1060m。

4.1.3 工程措施变化量及原因

工程措施工程量变化的主要原因：

主体工程防治区实际实施的排水沟工程量较设计相比增加 41m，主要为满足项目区排水要求，进行了局部优化；表土回填较设计相比增加 2734.34m³，主要由于项目区绿化面积增加，相应的表土回填量增加；植草砖铺设减少 4261 块，小区采取了人车分流，取消了地面停车位。

详见表 4.1-1 实际完成的水土保持措施与设计水土保持措施工程量对比情况。
详见图 4.1-1。

实际完成的水土保持工程措施与设计水土保持工程措施工程量对比情况
表 4.1-1 单位: 见表

序号	名称	单位	设计工程量	完成工程量	增减情况
	工程措施				
一	主体工程防治区				
1	雨水管	m	2434	2485	+41
2	雨水井	个	96	98	+2
3	雨水口	个	192	196	+4
4	表土回填	m ³	7886.46	10621.2	+2734.34
5	场地东侧边坡防护				
5.1	坡顶截水沟	m	259	262	+3
5.2	坡脚排水沟	m	245	247	+2
5.3	格构锚固工程	m ²	1500	1585	+85
6	植草砖铺设	块	4261	0	-4261
7	植草沟	m	1058.54	1060	+1.46

4.1.4 工程措施完成情况影像

图 4.1-1 工程措施完成情况影像



 雨水口	 雨水口
 格构锚固护坡	 格构锚固护坡
 雨水井	 雨水井

4.2 植物措施监测结果

4.2.1 方案设计植物措施

根据《中辉学府项目水土保持方案报告书》（报批稿），方案设计植物措施按各防治分区进行布设，主要有：

（1）主体工程防治区

方案设计的植物措施有场地绿化 18520.16m²（乔木 925 株，灌木 533000 株，草坪 5560m²）。西侧和北侧边坡绿化 2909.34m²（灌木 41000 株，草坪 1909.34m²）；南侧绿化带 3337m²（灌木 51250 株，草坪 2087m²）；格构梁内绿化 840m²；停

车位绿化 681.70m²。

4.2.2 植物措施监测结果

本工程水土保持植物措施主要施工时段为 2021 年 8 月至 2022 年 7 月实施。通过查阅竣工资料、监理月报、工程验收计量单、现场调查及卫星遥感影像复核等方法获取植物措施工程量，局部区域的调查采用无人机调查，已实施的水土保持植物措施如下：

(1) 主体工程防治区

完成的植物措施有场地绿化 31204m²（乔木 1250 株，灌木 640542 株，草坪 13142m²）。南侧绿化带 3400m²（灌木 52380 株，草坪 2110m²）；格构梁内绿化 800m²。

4.2.3 植物措施变化原因


植物措施工程量变化的主要原因：

为使更有效的防止水土流失且营造更美观的小区景观绿化，因此在原有植物措施基础上增加绿化面积 12683.84m²，乔木增加 325 株，灌木增加 107542 株，草皮增加 7582m²；西侧和北侧边坡进行了平整，改为场地绿化，边坡绿化减少 2909.34m²；小区采取了人车分流，取消地面停车位，因此停车位绿化减少 681.7m²。详见表 4.1-2 实际完成的水土保持措施与设计水土保持措施工程量对比情况。

实际完成的水土保持植物措施与设计水土保持植物措施工程量对比情况
表 4.1-2 单位：见表

序号	名称	单位	设计工程量	完成工程量	增减情况
植物措施					
主体工程防治区					
1	场地绿化	m ²	18520.16	31204	+12683.84
1.1	乔木	株	925	1250	+325
1.2	灌木	株	533000	640542	+107542
1.3	草坪	m ²	5560	13142	+7582
2	西侧和北侧边坡绿化	m ²	2909.34	0	-2909.34
3	南侧绿化带	m ²	3337	3400	+63
3.1	灌木	株	51250	52380	+1130
3.2	草坪	m ²	2087	2110	+23
4	格构梁内绿化	m ²	840	800	-40
5	停车位绿化	m ²	681.70	0	-681.70

4.2.4 植物措施完成情况影像

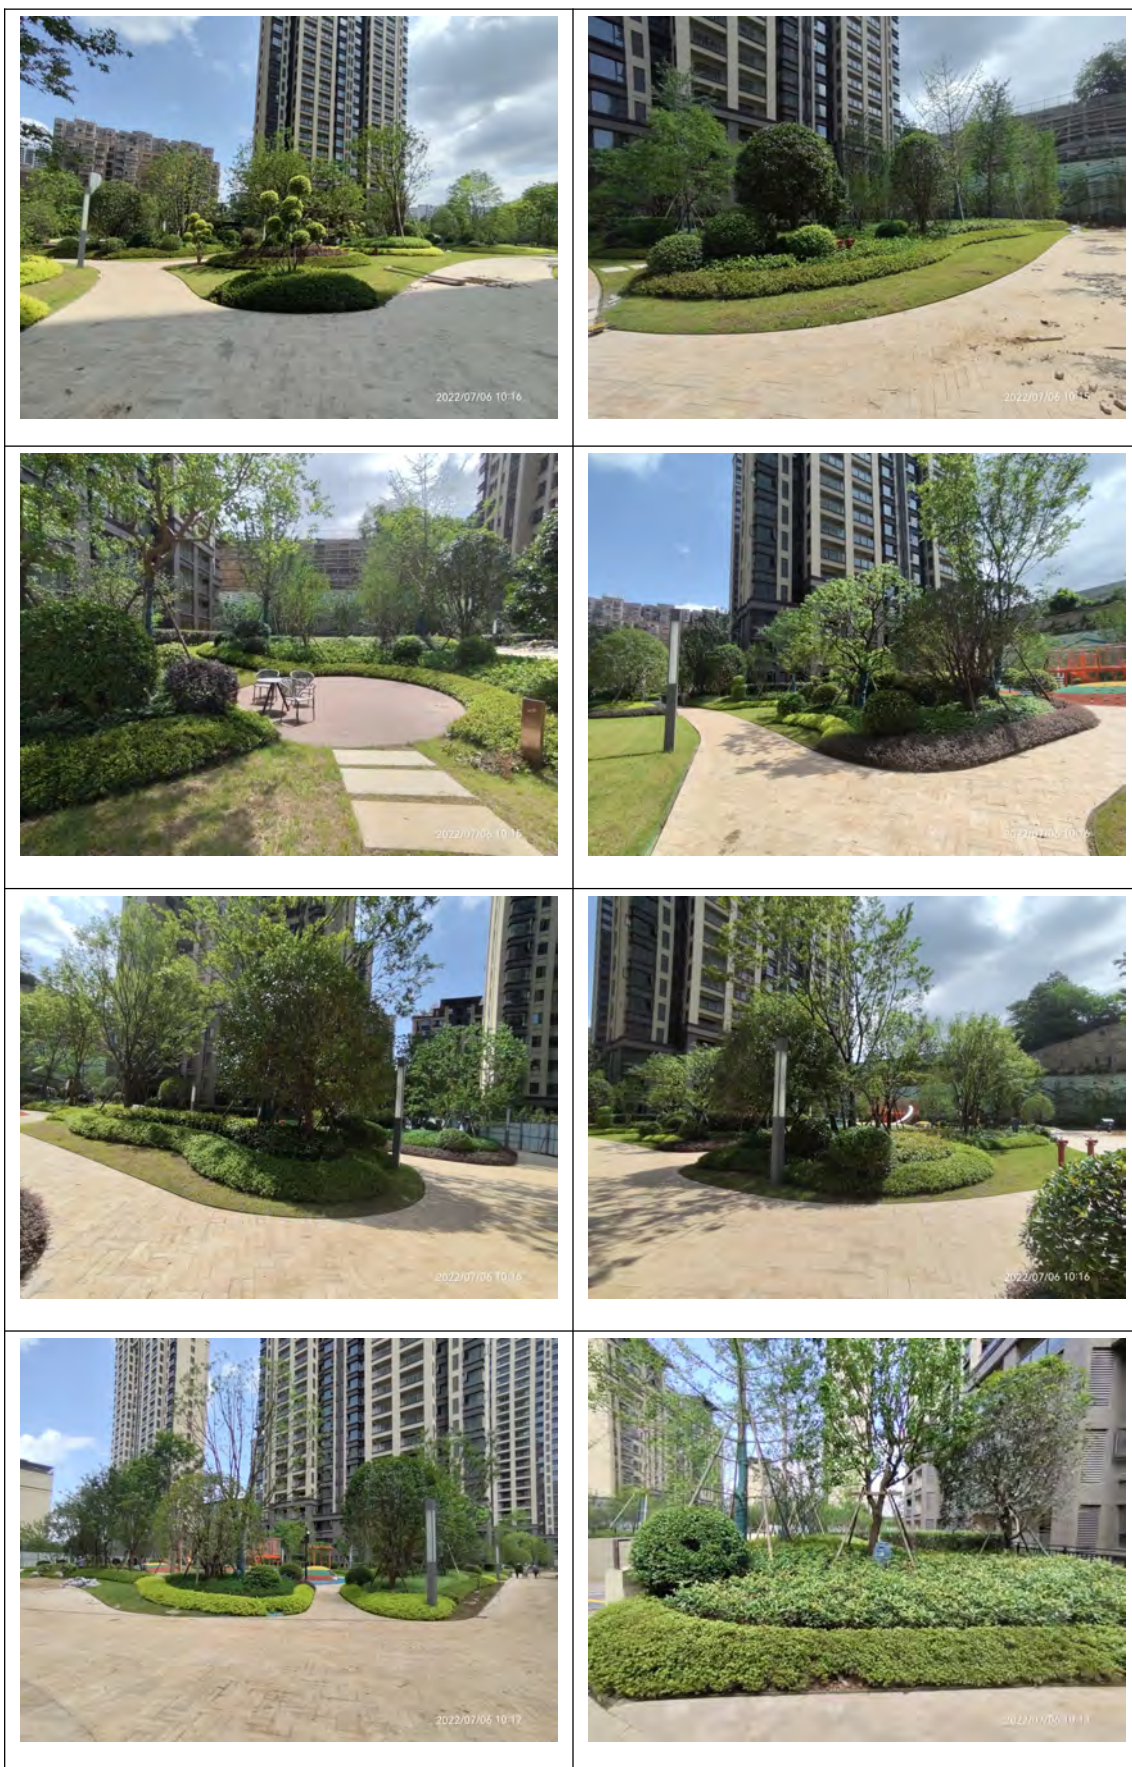



4.3 临时措施防治效果

4.3.1 方案设计临时措施

根据《中辉学府项目水土保持方案报告书》（报批稿），方案设计临时措施按未建工程及建筑垃圾消纳场防治分区进行布设，主要有：

（1）主体工程防治区

方案设计的临时措施有场地排水沟 758m，沉沙池 4 座，洗车槽 1 座，基坑排水沟 1425m，集水井 7 个，苫布覆盖 2500m²。

4.3.2 临时措施监测结果

根据现场长期监测、查阅设计资料、监理月报、工程验收计量单、现场调查及卫星遥感影像等方法得知实际完成临时措施工程量。

（1）主体工程防治区

实施的临时措施有场地排水沟 1060m，沉沙池 5 座，洗车槽 3 座，基坑排水沟 1040m，集水井 7 个，苫布覆盖 11180m²，临时围挡 2805m。

实际完成的水土保持临时措施与设计水土保持临时措施工程量对比情况
表 4.1-3 单位: 见表


序号	名称	单位	设计工程量	完成工程量	增减情况
临时措施					
主体工程防治区					
1	场地排水沟	m	758	1060	+302
2	沉砂池	个	4	5	+1
3	洗车槽	个	1	3	+2
4	基坑排水沟	m	1425	1040	-385
5	集水井	个	7	7	0
6	苫布覆盖	m ²	2500	11180	+8680
7	临时围挡	m	/	2805	+2805

4.3.3 临时措施变化原因

项目开工时, 监测工作组就已进场, 因此对项目有比较全面的记载, 通过调查监测及查阅项目季报, 项目区临时措施工程量略有变化, 但基本满足项目区施工期的水保防护要求。较设计相比场地排水沟增加 302m, 沉砂池增加 1 座, 3 个出入口均布设了洗车槽, 洗车槽增加 2 座, 基坑排水沟减少 385m, 苫布覆盖增加 8680m², 临时围挡增加 2805m。

4.3.4 临时措施完成情况影像



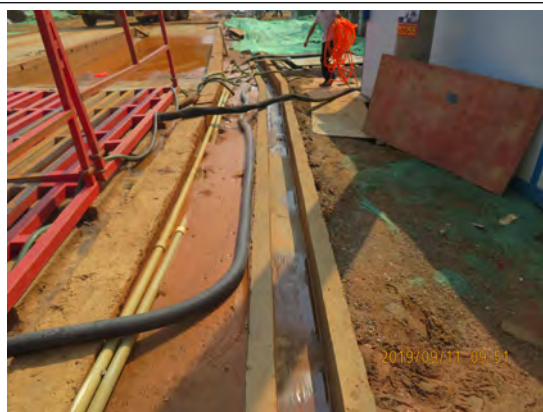

排水沟



临时覆盖



临时覆盖



沉沙池



临时覆盖



临时覆盖



临时围挡



临时围挡

4.4 水土保持措施防治效果

根据监测结果统计，该项目建设单位基本落实方案工程量，水土保持设施于2019年7月开工，2022年7月完工，总工期37个月。

随着各项防治措施的逐步实施完毕，水土流失源得到了全面控制，只有植物措施面积3.54hm²存在微度水土流失。平均土壤侵蚀模数由建设期9225t/(km²·a)降至467t/(km²·a)，水土流失基本得到控制。

第5章 水土流失情况监测

5.1 水土流失面积

5.1.1 施工准备期水土流失面积

项目区地处南方红壤丘陵侵蚀区,水土流失类型主要以地表径流冲刷引起的水力侵蚀为主,容许土壤流失量为 $500\text{t}/(\text{km}^2\cdot\text{a})$ 。

通过项目区水土流失调查,项目区现有水土流失面积总计 6.44hm^2 ,占项目征占地总面积的 100%,根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》,确定平均土壤侵蚀模数为 $1306.53\text{t}/(\text{km}^2\cdot\text{a})$,年土壤侵蚀总量为 84.14t/a 。水土流失强度为轻度侵蚀。详见表 5.1-2。

施工准备期监测区水土流失情况表

表 5.1-2

监测分区	项目建设区面积 (hm^2)	水土流失面积占 用地面积 (%)	水土流失面积 (hm^2)	各级水土流失面积 (hm^2)		
				轻度	中度	强烈
主体工程防治区	6.44	100	6.44	6.44	/	/
合计	6.44	100	6.44	6.44	/	/

5.1.2 施工期水土流失面积

项目于 2019 年 7 月开工,2022 年 7 月完工,总工期 37 个月。随着施工强度的逐步加大,各区域扰动土地面积不断增加,水土流失面积也随之增加。通过长期监测及查阅施工设计文件、施工进度安排、施工过程中的影像资料及施工期遥感影像数据等资料,对项目建设中的水土流失面积进行统计分析,水土流失面积具体情况见表 5.1-3、5.1-4。

施工期监测区水土流失情况表 (开挖及回填区域)

表 5.1-3

监测分区	项目建设区面积 (hm^2)	水土流失面积占用地 面积 (%)	水土流失面积 (hm^2)	各级水土流失面积 (hm^2)		
				轻度	中度	强烈
主体工程防治区	6.44	100	6.44			6.44
合计	6.44	100	6.44			6.44

施工期监测区水土流失情况表 (临时堆存区域)

表 5.1-4

监测分区	项目建设区面积 (hm^2)	水土流失面积占用地 面积 (%)	水土流失面积 (hm^2)	各级水土流失面积 (hm^2)		
				轻度	中度	强烈

主体工程防治区	6.44	3.1	0.20		0.20	
合计	6.44	3.1	0.20		0.20	

5.1.3 试运行期水土流失面积

2022年7月，项目完工投入运行，随着各项水土保持工程的陆续建成，项目建设区的植物措施林草保存率、覆盖率的提高，项目建设区基本无水土流失面积，具体情况见表 5.1-5。

试运行期监测区水土流失情况表

表 5.1-5

监测分区	项目建设区面积 (hm ²)	水土流失面积占用地 面积 (%)	水土流失面积 (hm ²)	各级水土流失面积 (hm ²)		
				轻度	中度	强烈
主体工程防治区	6.44	/	/	/	/	/
合计	6.44	/	/	/	/	/

5.2 土壤流失量

5.2.1 施工准备期土壤流失量

通过项目区水土流失调查，项目区现有水土流失面积总计 6.44hm²，占项目征占地总面积的 100%，根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》，确定平均土壤侵蚀模数为 1306.53t/(km²·a)，年土壤侵蚀总量为 84.14t/a。水土流失强度为轻度侵蚀。

施工准备期监测区水土流失情况表

表 5.2-1

监测分区	项目建设区 面积 (hm ²)	水土流失面积占 用地面积 (%)	水土流失 面积 (hm ²)	各级水土流失面积 (hm ²)			平均土壤侵 蚀模数 t/ (km ² ·a)	年均土壤侵 蚀总量 (t)
				轻度	中度	强烈		
主体工程防 治区	6.44	100	6.44	6.44			1306.53	84.14
合计	6.44	100	6.44	6.44			1306.53	84.14

5.2.2 施工期土壤流失量

项目建设过程中，随着土石方工程的施工建设，主体工程挖、施工便道等临时用地的修建和使用等，对项目区的原地貌、土地和植被均产生了不同程度的扰动和损坏，产生了新的水土流失，项目区水土流失量有所增加，建设中项目区年均土壤侵蚀总量为 603.3t，开挖及回填区域平均土壤侵蚀模数为 9225t/km²·a，临

时堆存区域平均土壤侵蚀模数为 $4604\text{km}^2\cdot\text{a}$ ，各监测区的土壤流失情况如下表 5.2-2、5.2-3。

施工期监测区水土流失情况表（开挖及回填区域）

表 5.2-2

监测分区	项目建设区面积 (hm^2)	水土流失面积占用地面积 (%)	水土流失面积 (hm^2)	各级水土流失面积 (hm^2)			平均土壤侵蚀模数 $t/(\text{km}^2\cdot\text{a})$	年均土壤侵蚀总量 (t)
				轻度	中度	强烈		
主体工程防治区	6.44	100	6.44			6.44	9225	594.09
合计	6.44	100	6.44			6.44	9225	594.09

施工期监测区水土流失情况表（临时堆存区域）

表 5.2-3

监测分区	项目建设区面积 (hm^2)	水土流失面积占用地面积 (%)	水土流失面积 (hm^2)	各级水土流失面积 (hm^2)			平均土壤侵蚀模数 $t/(\text{km}^2\cdot\text{a})$	年均土壤侵蚀总量 (t)
				轻度	中度	强烈		
主体工程防治区	6.44	3.1	0.20		0.20		4604	9.21
合计	6.44	3.1	0.20		0.20		4604	9.21

5.2.3 试运行期土壤流失量

2022 年 7 月，项目完工投入运行，随着各项水土保持工程的陆续建成，项目建设区的植物措施林草保存率、覆盖率的提高，项目建设区基本无水土流失面积，具体情况见表 5.2-4。

试运行期监测区水土流失情况表

表 5.2-4

监测分区	项目建设区面积 (hm^2)	水土流失面积占用地面积 (%)	水土流失面积 (hm^2)	各级水土流失面积 (hm^2)			平均土壤侵蚀模数 $t/(\text{km}^2\cdot\text{a})$	年均土壤侵蚀总量 (t)
				轻度	中度	强烈		
主体工程防治区	6.44	/	/	/	/	/	467	/
合计	6.44	/	/	/	/	/	467	/

5.3 取料、弃渣潜在土壤流失量

根据《中辉学府项目水土保持方案报告书》及批复文件本项目未设置取料、弃渣场。借方为绿化表土，由施工单位负责外购。实际临时堆存土方量为 0.41 万 m^3 ，施工过程中采取了临时防护措施，实际拦挡土方量约为 0.407 万 m^3 。工程实际施工过程中产生共计土石方挖填量为 43.47 万 m^3 ，其中挖方 29.55 万 m^3 ，填方 13.92 万 m^3 （含表土 1.06 万 m^3 ），借方 1.06 万 m^3 （含表土 1.06 万 m^3 ），综合利用方 16.69 万 m^3 。其中场地内清理的建筑垃圾 5.56 万 m^3 由江西中丰建筑

工程有限公司负责运至九江市城市管理局许可的滨江东路 188 号德利智能制造产业园消纳点用于综合利用；其他的余方 11.13 万 m^3 ，由江西中丰建筑工程有限公司外运至九江市城西港区江西泰盛纸业有限公司二标段项目用于回填。

5.4 水土流失危害

在监测过程中项目区目前未发生明显的水土流失危害事件。

第6章 水土流失防治效果监测结果

6.1 水土流失总治理度

水土流失总面积为扰动土地总面积减去建(构)筑物、道路和场地硬化面积,根据监测结果得知,本项目建设区共扰动土地面积为 6.44hm^2 ;其中,道路、建筑物及硬化面积 2.97hm^2 ,计算得出本工程水土流失治理面积为 6.44hm^2 ,建设单位对水土流失区域实施水土保持措施面积为 6.44hm^2 。由此计算项目区水土流失总治理度为100%,超过方案目标值98%。

水土流失治理度计算表

表6-1

单位: hm^2

防治分区	防治责任面积	水土流失面积	水土流失治理面积				治理度(%)
			工程措施	植物措施	道路、建筑物及硬化面积	小计	
主体工程防治区	6.44	6.44	0.01	3.46	2.97	6.44	100
合计	6.44	6.44	0.01	3.46	2.97	6.44	100

6.2 土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失量之比。其计算公式如下:

土壤流失控制比=项目建设区容许土壤流失量/治理后的平均土壤流失强度
根据《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)及本工程水土保持报方案,结合工程所在区域的土壤侵蚀类型与强度,本工程区的容许土壤流失量为 $500\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ 。截至2022年7月该工程项目治理后的平均土壤侵蚀强度达到 $467\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$,土壤流失控制比平均为1.07,超过了防治标准1.0。

6.3 渣土防护率

项目水土流失防治责任范围内工程实际施工过程中共计产生土石方挖填量为 43.47万m^3 ,其中挖方 29.55万m^3 ,填方 13.92万m^3 (含表土 1.06万m^3),借方 1.06万m^3 (含表土 1.06万m^3),综合利用方 16.69万m^3 。其中场地内清理的建筑垃圾 5.56万m^3 由江西中丰建筑工程有限公司负责运至九江市城市管理局许可的滨江东路188号德利智能制造产业园消纳点用于综合利用;其他的余方 11.13万m^3 ,由江西中丰建筑工程有限公司外运至九江市城西港区江西泰盛纸业有限公司二标段项目用于回填。实际临时堆存土方量为 0.41万m^3 ,实际施工过程中采取了临时

防护措施，实际拦挡土方量约为0.407万m³。，渣土防护率为99.27%，超过方案目标值98%。

6.4 表土保护率

根据现场勘查得知，原始场地基本被早期堆存的建筑垃圾覆盖，地表土壤中杂质较多，不满足后期绿化覆土要求，后期绿化覆土全部外购。因此表土保护率不计入指标。

6.5 林草植被恢复率

项目建设区可恢复植被面积为3.46hm²，完成水土保持植物措施面积为3.46hm²，由此计算项目区林草植被恢复率为100%，超过方案目标值98%。

林草植被恢复率计算表

表 6-2

单位：hm²

防治分区	实际扰动面积	可绿化面积	已恢复面积			植被恢复系数(%)	林草覆盖度(%)
			人工绿化	自然恢复	小计		
主体工程防治区	6.44	3.46	3.46	0	3.46	100	53.73
合计	6.44	3.46	3.46	0	3.46	100	53.73

6.6 林草覆盖率

本工程项目征占地总面积为6.44hm²，完成水土保持植物措施面积为3.46hm²，项目区林草覆盖率为53.73%，超过方案目标值27%。

林草植被覆盖率计算表

表 6-3

单位：hm²

防治分区	实际扰动面积	可绿化面积	已恢复面积			林草覆盖度(%)
			人工绿化	自然恢复	小计	
主体工程防治区	6.44	3.46	3.46	0	3.46	53.73
合计	6.44	3.46	3.46	0	3.46	53.73

第 7 章 结论

7.1 水土流失动态变化

本工程防治责任范围为 6.44hm²，防治范围内水土保持防治责任得到落实；项目土石方主要集中在场地平整开挖、土方回填时段，其他时间段土石方变化较少，土石方施工过程中未造成较大的水土流失危害的隐患，与水土保持方案设计方向、措施类型等基本保持一致。

工程实际完成水土流失防治指标和水土保持方案中设计的防治指标详见表 7.1-1。

水土流失防治指标对比分析表

表 7.1-1

防治指标	方案设计	项目建设区	综合评价
水土流失总治理度	98%	100%	达标
土壤流失控制比	1.0	1.07	达标
渣土防护率	98%	99.27%	达标
表土保护率	/	/	/
林草植被恢复率	98%	100%	达标
林草覆盖率	27%	53.73%	达标

项目水土流失总治理度，土壤流失控制比，渣土防护率，林草植被恢复率，林草覆盖率。都达到了水土保持方案设计目标。

7.2 水土保持措施评价

水土保持监测除了反映建设项目水土流失状况、水土保持措施的实施情况外，也是对水土保持方案的检验，方案确定的水土保持措施已得到了全面的实施。

本项目水土保持防治工程措施都已实施完毕。已完成的水保工程措施均按照水土保持方案设计施工修建，已实施的措施目前均运行良好，达到了防治水土流失、保护工程本身安全的防治效果，水土保持防治效果显著。

方案设计的植物措施都已完成。已完成的植物措施基本按照水土保持方案设计实施，对道路、场地采取地被的种植方式，草种大部分选择以乡土树种居多，平均成活率达到 98%；对各区域采取了地被等。总体来说，植物措施的实施起到了防治水土流失，起到固土保水的水土保持防治效果。

水土保持措施总体布局上基本维持了原方案设计的框架，建设单位严格按照施工图设计进行施工，工程永久占地区域内的工程标准高、防护效果显著、生态

恢复良好，完成的水土保持工程数量和质量符合设计要求。通过对工程现场的抽查、核实，工程建设期间未发生水土流失事故，水土流失防治效果达到了国家有关法律法规的规定及技术规范与标准的要求，水土保持工程投资基本合理。

7.3 存在问题及建议

（1）监测过程中总结的经验：

对已完成工程措施、植物措施加强后续管护，对未成活植被及植被稀疏地块进行及时补种；打造一个良好的小区环境。

（2）监测过程存在的问题及建议

根据生产建设项目水土保持监测的要求，要全面准确地反映建设项目的水土流失情况，水土流失量的确定是监测工作的难点。各监测点可供监测的时间较短，现有的传统监测方法有较大的局限，但在现阶段的技术条件下又不得不依托传统的监测方法，探索一套适合于生产建设项目特点的水土流失监测方法势所必然。

植物措施及工程措施的侵蚀强度的监测方法有待进一步研究。

①生产建设项目水土保持监测是验证项目水土保持方案、水土保持措施实施情况及效果的根本手段，是水土保持工程验收的基本依据。必须开展水土保持监测才能及时反映建设项目施工过程中的扰动范围、水土流失程度的动态变化及水土保持措施实施的数量和效果，才能检验水土保持方案及措施是否适宜、是否有效，同时为今后开展水土保持编制工作提供有益的经验。

②准确的反映生产建设项目水土流失状况要从复杂的工程建设内容找出引发水土流失的因子。根据水土流失形态、侵蚀物质组成以及基本相似的水土流失强度归纳出基本地表扰动类型，这些基本类型能够涵盖整个工程的所有建设内容所产生的水土流失种类，取得了较好的监测效果。

③利用多种方法检测基本扰动类型侵蚀强度。基本扰动类型侵蚀强度的监测是监测工作的重点和难点，这是统计整个项目水土流失量以及评价工程水土流失程度必不可少的内容。

④多方面参与监测工作。为了提高监测质量，邀请有关技术部门、施工单位和现场施工人员进行实地调查，对监测实施过程中遇到的问题进行讨论，保证了监测工作的顺利进行和监测成果的质量。

（3）存在问题及建议

生产建设项目的水土保持措施，不仅仅是为环境建设服务，同时也为主体工程服务，对于改善周边环境、保障主体工程的安全运行具有重要的作用。项目绿化工程已全部完工，但部分地块仍存在植被稀疏、成活率低等情况。

对已完成的水土流失防治措施，要加强管护、维修，尤其是植物措施，要认真做好抚育管理，对适应性差成活率低的灌木应进行树种更换，使其尽快发挥防护效益，同时建议加强项目绿化植被的管理和维护，对局部裸露地块进行补植。

7.4 综合结论

建设单位对工程建设中的水土保持工作较为重视，经我单位提出监测意见后，在后续管护过程中严格按照要求进行补植及后续管护。目前已完成的防治措施均运行良好，基本达到了方案设定的目标值。

在项目建设过程中，施工方基本能够贯彻防治结合、以防为主的方针，施工时能尽量减少工程开挖对周边环境的破坏；监测过程中对工程建设引起的扰动情况、开挖情况、水土流失的变化情况、各类水土保持工程的实施情况及防治效果等，做了相应的调查、记录，给实施监督管理时提供一定依据。

项目法人单位将水土保持工程的建设和管理纳入高标准、规范化管理模式和程序中，在工程建设过程中落实了项目法人、设计单位、施工单位、监理单位的水土保持职责，强化了对水土保持工程的管理，实行了“项目法人负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量管理体系，以确保水土保持方案的顺利实施。对水土流失防治责任区内的水土流失进行着全面、系统的整治，较好完成了水土保持方案确定的防治任务。

我单位于 2019 年 9 月至 2022 年 7 月开展了本项目水土保持监测工作，根据水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知（办水保【2020】161 号）文件的要求，通过现场调查及无人机遥感监测等监测方法，于 2020 年第三季度开始对本项目每季度水土保持监测季度报表中生产建设项目水土保持监测三色评价进行评定。至目前为止，三色评价等分情况如下：

2020 年第三季度水土保持监测季度报表得分为 88 分（绿色）

2020 年第四季度水土保持监测季度报表得分为 98 分（绿色）

2021 年第一季度水土保持监测季度报表得分为 96 分（绿色）

2021 年第二季度水土保持监测季度报表得分为 92 分（绿色）

2021 年第三季度水土保持监测季度报表得分为 87 分（绿色）

2021 年第四季度水土保持监测季度报表得分为 91 分（绿色）

2022 年第一季度水土保持监测季度报表得分为 90 分（绿色）

2022 年第二季度水土保持监测季度报表得分为 91 分（绿色）（详见附件）

综上所述，监测期间本项目水土保持监测三色评价得分情况为 8 次绿色，最终评价为绿色。监测过程中项目区内未发生水土流失危害，符合水土保持竣工验收条件。

项目竣工后，由九江中广置业有限公司对本项目水土保持设施实行行政主管部门领导下的专业人员负责制，负责运营管护。

目前，各水土保持设施运行情况良好，达到了设计要求，具备了生产建设项目水土保持竣工验收条件。

第 8 章 附图及有关资料

8.1 附件附图

8.1.1 附件

- 1、监测任务委托书；
- 2、监测中影像资料；
- 3、关于中辉学府项目水土保持方案报告书的批复；

8.1.2 附图

- 1、中辉学府项目地理位置图；
- 2、中辉学府项目防治责任范围图；
- 3、中辉学府项目监测分区及监测点位图；

8.2 有关资料

- 1、土石方相关资料；
- 2、工程措施预结算资料；
- 3、植物措施预结算资料；
- 4、水土保持监测季度报表；

附

件

附件一：监测任务委托书

委 托 书

九江绿野环境工程咨询有限公司：


根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江西省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》等法律法规和有关文件规定要求，兹委托九江绿野环境工程咨询有限公司对中辉学府项目进行水土保持监测工作。

特此委托。





附件二：监测过程中的影像资料

 雨水口	 雨水口
 雨水口	 雨水口
 格构锚固护坡	 格构锚固护坡
 雨水井	 雨水井
工程措施	

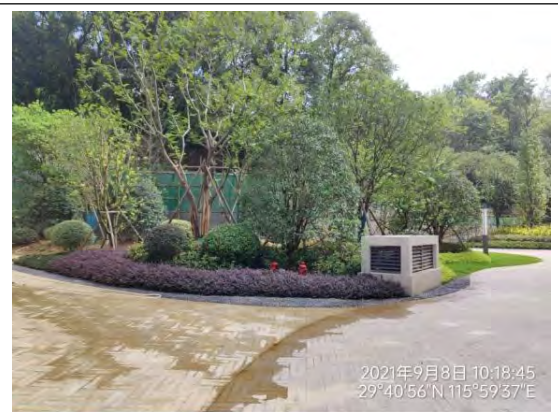



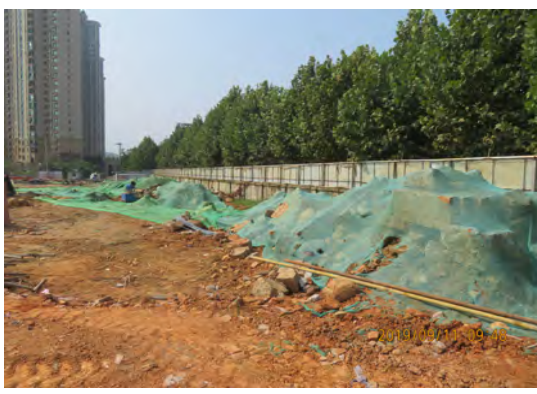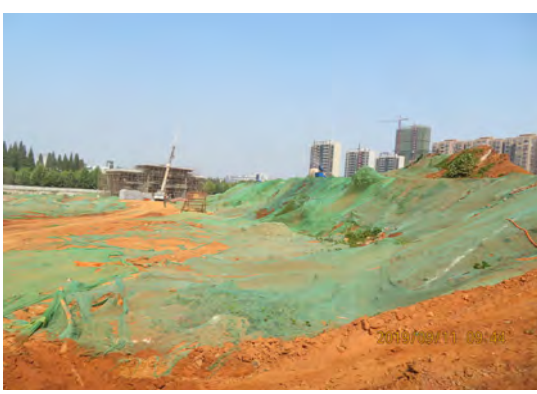

 排水沟	 临时覆盖
 临时覆盖	 沉沙池
 临时覆盖	 临时覆盖
 临时围挡	 临时围挡
临时措施影像	

九江市濂溪区水利局文件

濂水字〔2019〕84号

关于《中辉学府项目水土保持方案报告书》 审批意见的函

九江中广置业有限公司：

你公司提交的《关于要求审批<中辉学府项目水土保持方案报告书>的申请报告》收悉。

中辉学府项目位于九莲北路79号，规划建设17栋高层住宅楼、1栋高层公寓式酒店、1栋配套用房、地下室、道路及绿化等配套设施。项目总建筑面积160605.40m²，建筑密度30%，绿地率39.87%，容积率2.0。

项目征占地总面积6.44hm²，全部为永久占地。土石方工程量为挖方28.32万m³，填方13.54万m³（含表土0.79万m³），借方0.79万m³（含表土0.79万m³），综合利用方15.57万m³。

工程总投资 10 亿元，其中土建投资 7 亿元，资金来源于建设单位自筹。项目已于 2019 年 7 月开工，预计 2022 年 6 月完工，总工期 36 个月。

2019 年 8 月 29 日濂溪区水利局组织有关专家对《中辉学府项目水土保持方案报告书》进行了技术审查。经研究，我局基本同意该水土保持方案。现将审批函复如下：

一、基本意见

（一）基本同意主体工程水土保持评价。

（二）基本同意水土流失防治措施体系及总体布局，同意水土流失防治执行建设类项目一级标准。

（三）基本同意设计水平年（2023 年）水土流失防治目标为：水土流失治理度 98%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 98%，林草植被恢复率 98%，林草覆盖率 27%。

（四）同意建设期水土流失防治责任范围为 6.44hm²。

（五）基本同意水土流失防治分区和分区防治措施。下阶段应进一步优化防治措施设计和施工组织，减少土石方挖填数量，尽量减少地表扰动和植被损坏。

（六）基本同意水土保持总投资为 879.98 万元，其中水土保持补偿费为 64391 元。

（七）基本同意水土保持方案实施进度安排。

(八) 基本同意水土保持监测时段、内容和方法。

二、基本要求

(一) 生产建设单位在项目建设中应全面落实《水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作。

1、按照批复的水土保持方案，做好水土保持施工图设计等后续设计，加强施工组织和管理工作的，切实落实水土保持“三同时”制度。

2、严格按方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好临时防护措施，严格控制施工期可能造成水土流失。加强对南侧十里河的保护，严禁占用河道及向河道内倾倒建筑垃圾。

3、落实水土保持监测工作，并按规定向濂溪区水利局提交监测实施方案和监测季报。

4、落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(二) 本项目的地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中，水土保持措施发生重大变更，应及时补充或修改水土保持方案，报濂溪区水利局审批。

(三) 本项目在投产使用前，建设单位应按照《水利部关于

加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）的规定，开展水土保持设施竣工自主验收，并向濂溪区水利局报备。水土保持设施未验收或者验收不合格不得投产使用。

此函。



九江市濂溪区水利局

2019年9月12日印发

附件四：土石方相关资料

土石方工程验收表

工程名称	中辉学府项目	部位	三通一平	验收日期	年 月 日
土石方情况	项目土石方挖填总量为43.47万m³，其中挖方29.55万m³，填方13.92万m³（含表土1.06万m³），借方1.06万m³（含表土1.06万m³），综合利用方16.69万m³。其中场地内清理的建筑垃圾5.56万m³，由江西中丰建筑工程有限公司负责运至九江市城市管理局许可的滨江东路188号德利智能制造产业园消纳点用于综合利用；其他的余方11.13万m³，由江西中丰建筑工程有限公司外运至九江市城西港区江西泰盛纸业有限公司二标段项目用于回填。				
验收人		施工负责人			
施工单位 验收意见	按设计要求施工，自验合格 				
设计单位 验收意见	合格  (盖章)				
建设单位 验收意见	验收合格 				
监理单位 验收意见	符合设计要求  (盖章)				
汇总意见	合格 				

九江市 建筑垃圾处置核准证

NO: 2019016

江西中辉建设工程有限公司:

九江市城市管理局根据《城市建筑垃圾管理规定》
第七条之规定同意你单位申报的 中辉学府 项目
建筑垃圾处置核准申请,予以核发许可。

处置地点: 濂溪区九莲北路与学院路路口

处置时间: 2019年8月15日至2019年9月10日

运输线路: 九莲北路-德化路-长虹东大道-琴湖大道-城东港

消纳场地: 滨江东路188号德利智能制造产业园消纳点

变更事项:

核准处置方量		
55555.6m ³		



工程土方接收函

九江中广置业有限公司：

经我司现场质量负责人确认，贵公司承接的中辉学府项目土石方工程的外运土方满足我司建设的江西泰盛纸业有限公司二标段项目回填要求，我司愿意接受该项目余土，约 11 万立方米。贵司要遵守我司现场负责人的安排，将余土运至指定地点，同时余土运输过程中贵司要遵循水土保持、环保、执法等相关部门的要求，并承担相应责任。

江西泰盛纸业有限公司（盖章）



2019 年 9 月 8 日

附件五：工程措施预结算资料

工 程 结 算 书

施工单位：江西筑信建设集团有限公司

工程名称：中辉学府项目排水工程

结构类型：

建筑面积： (平米)

工程总计： 226.51 (万元)

编制时间：

工程编号：

审核人： 编制人：

工程措施汇总表

项目名称：中辉学府项目

施工单位：江西筑信建设集团有限公司

序号	项目名称	工程量	单价	合计（元）
一	雨水管(m)			
	DN500	1485	380.00	564300
	DN400	600	360.00	216000
	DN300	400	280.00	112000
二	雨水口(口)	196	200.00	39200
三	雨水井(座)	98	2150.00	210700
四	表土回填(m³)	10621.2	5.90	62665.08
五	场地东侧边坡防护			
5.1	坡顶截水沟(m)	262	675.20	176902.4
5.2	坡脚排水沟(m)	247	644.90	159290.3
5.3	格构锚固工程(m³)	1585	438.20	694547
六	植草沟(m)	1060	27.80	29468
合计				2265072.78

附件六：植物措施预结算资料

工程结算书

施工单位：江西筑信建设集团有限公司
工程名称：中辉学府项目绿化工程
结构类型：
建筑面积：（平米）
工程总计：560.45（万元）

编制时间：

工程编号：

审核人：编制人：

植物措施汇总表

项目名称：中辉学府项目

施工单位：江西筑信建设集团有限公司

项目名称	实际量（株）	单价	合计（元）
乔木	1250		
香樟 A	83	2100.00	174300
香樟 B	72	1300.00	93600
广玉兰	95	725.00	68875
桂花 A	148	658.00	97384
桂花 B	157	387.00	60759
杜英	125	278.00	34750
夹竹桃	37	152.00	5624
红叶石楠柱	121	115.00	13915
山茶	57	156.00	8892
金边黄杨	53	245.00	12985
紫玉兰	72	355.00	25560
女贞	133	185.00	24605
紫薇	97	125.00	12125
灌木			
红叶榿木	427850	7.50	3208875
金叶女贞	114876	3.97	455501.5
杜鹃	75715	6.50	492147.5
大叶黄杨球	856	1.80	1540.8
西府海棠	155	3.50	542.5
丛生木槿	6255	5.60	35028

丛生结香	495	4.50	2227.5
麦冬	62465	1.50	93697.5
刚竹	4255	9.60	40848
地被			
台湾青 (m ²)	15252	42.00	640584
撒播草籽 (m ²)	800	0.08	64
合计			5604430.3

附件七：水土保持监测季度报表
